

Utförare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  1 (11)
Projekt LINK2	Noteringar		Informationsklass	

# LINK2

## Region Jönköpings län

Utfärdare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  2 (11)
Projekt LINK2	Noteringar		Informationsklass	

## Innehållsförteckning

1	Om dokumentet .....	3
1.1	Informationsklass .....	3
1.2	Versionshistorik .....	3
2	Inledning .....	3
2.1	Bakgrund till projektet .....	3
2.2	Beställare/Projektägare .....	5
3	Mål.....	5
3.1	Effektmål.....	5
3.2	Projektmål .....	5
3.3	Prioriteringstriangel .....	6
3.4	Tidsplan.....	7
4	Omfattning .....	7
4.1	Omfattning .....	7
4.2	Beroenden till andra projekt.....	8
4.3	Avgränsningar .....	8
5	Nyttor.....	8
6	Ekonomi.....	8
6.1	Finansiering.....	8
6.2	Kostnader .....	8
6.3	Resurser.....	9
6.4	Styrgrupp.....	9
7	Förvaltningsansvar.....	9
8	Legala frågor.....	9
8.1	Lagar och Avtal.....	10
9	Begrepp och definitioner .....	11
10	Bilagor .....	11

Utfärdare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  3 (11)
Projekt LINK2	Noteringar		Informationsklass	

## 1 Om dokumentet

### 1.1 Informationsklass

Inför breddinförandet av Link gjordes en informationsklassning via Klassa, med nedanstående resultat. Säkerhetsnivåer:

Konfidentialitet - Nivå 2

Riktighet - Nivå 2

Tillgänglighet - Nivå 2

Spårbarhet - Nivå 2

Bedömning behöver göras av om en uppgraderad informationsklassning behöver göras av Link2.

### 1.2 Versionshistorik

Version	Datum	Utfärdare	Beskrivning
1:1	2018-05-07		
1:2	2018-05-18		
1:3	2018-05-21		

## 2 Inledning

### 2.1 Bakgrund till projektet


Idag används Link i Region Jönköpings län, samt i länets kommuner. Link är ett stöd för samordnad vårdplanering som används av kommun, primärvård och sjukhus. Vårdplaneringsprocessen består av en sammanhållen ärendehantering. Link ger möjlighet för slutenvård, kommun och primärvård att hantera de olika faserna i vårdplaneringsprocessen utifrån respektive verksamhet. Vårdplanering i Link innebär att alla inblandade parter kan få aktuell information för den samordnade vårdplaneringen i takt med att den uppdateras elektroniskt i Cosmic Link, förutsatt att patienten lämnat samtycke.

*Cosmic Link är en teknisk funktion som länkar samman de olika kontaktvägar och kommunikation som är mellan kommunen, slutenvården och primärvården. Link hämtar viss information från Cosmic och därför kan behörig personal få tillgång till den patientinformation de behöver i vårdplaneringsprocessen. Det kan till exempel vara journaluppgifter, epikriser och läkemedelslista. Inskrivningsmeddelandet, kallelserna till vårdplaneringen och utskrivningsmeddelandet sker helt elektroniskt i Link. (Cambio, 2018)*

Cosmic Link infördes 27 april 2017 i Region Jönköpings län och ersatte det tidigare systemet Meddix. Införandet inleddes med en förberedande pilottest som startade i februari 2017 i Eksjö. I samband med förberedelserna utsågs superanvändare som fick fördjupad utbildning och information om Link och vårdplaneringsprocessen och kommande förändringar i linje med nya

Utfärdare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  4 (11)
Projekt LINK2	Noteringar		Informationsklass	

betalningsansvarslagen, som trädde i kraft 2018-01-01. Informationstillfällen gavs på respektive sjukhus för övriga berörda och intresserade vid upprepade tillfällen under mars och april 2017. Folkhälsa och sjukvård samt IT-centrum i Region Jönköpings län hade ansvar för support den närmaste tiden kring breddinförandet, samt i mindre omfattning även senare. Frågor rörande Link och vårdplaneringsprocessen har därefter hanterats inom ordinarie förvaltning på Folkhälsa och sjukvård och på IT-centrum.

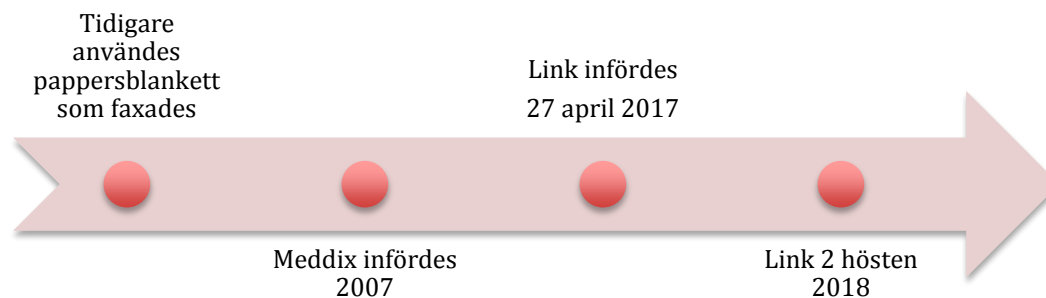

I nuvarande version av Link saknas viktiga funktioner för samverkan i vårdplaneringsprocessen enligt den nya betalningsansvarslagen. En ny version av Link, LINK2, har utvecklats för att möta behoven av saknade funktioner, kopplade till de krav som de förändrade arbetssätt medför i samband med att betalningsansvarslagen ändrats. LINK2 är en helt omarbetad ny version av nuvarande Link, och innehåller helt nya funktioner för samordnad vårdplanering och vårdplaneringsprocessen, varför en väl planerad införandeprocess med utbildningsinsatser och tillhörande förberedelser är nödvändigt för berörda parter.

I Region Jönköpings län finns ett etablerat koncept för förberedelser, utbildning och support som användes vid breddinförandet av Link. Detta koncept kommer att användas för LINK2 i modifierad form, eftersom erfarenhet och grundläggande kompetens nu finns om Link. Planering, förberedelser samt utbildningsplanering har påbörjats av ansvariga i Region Jönköpings län.

Utvecklingen av LINK2 har genomförts i samverkan med Cambio och övriga Cosmickunder under perioden våren 2017- våren 2018. En referensgrupp har arbetat med att gemensamt prioritera krav och funktioner, samt med att gemensamt bedöma de lösningsförslag som presenterats fortlöpande. Deltagare i referensgruppen har varit verksamhetsföreträdare för sjukvården, IT och kommun från samtliga Cosmickunder. Acceptanstester har genomförts och godkänts gemensamt av referensgruppen. Den slutliga produkten acceptanstestas och slutgodkänns av Västmanlands Läns Landsting som är acceptanskontrollör för Link2, enligt det koncept som man arbetar efter kundgemensamt i Cosmics kundgrupp. Gemensam planering av införande och implementering av LINK2 har beslutats i kundgrupp Cosmic. För Region Jönköpings län innebär det driftsättning av LINK2 vecka 48.

Utfärdare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  5 (11)
Projekt LINK2	Noteringar		Informationsklass	

## 2.2 Beställare/Projektägare

Anette Peterson, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Regionledningskontoret, Region Jönköpings län.

## 3 Mål

### 3.1 Effektmål

Ett övergripande effektmål är att uppnå den gemensamma visionen för samverkan, som innebär att invånarna i länet ska kunna säga och uppleva "Jag får den vård och omsorg jag behöver, där jag behöver och när jag behöver". (Region Jönköpings län, 2018, s. 4) Tanken med visionen är att värdet för invånarna höjs när kommunernas och regionens medarbetare arbetar efter gemensamma mål och med en tydlig ansvarsfördelning. (Region Jönköpings län, 2018)

Förbättrade och nya funktioner som stödjer arbetet med samordnad vårdplanering, gällande vårdplaneringsprocess, samt anpassning till den förändrade betalningsansvarslagen som ändrades vid årsskiftet är också betydande effektmål, liksom de förbättrade och nya ändamålsenliga funktioner som finns i LINK2 som kommer att underlätta och bidra till att arbetsmomenten i vårdplaneringsprocessen kan utföras på ett säkert och effektivt sätt.

Nedan listas några av de krav och önskemål som definierats tidigare under arbetet med Link, och som kommer med som förbättrade och utvecklade funktioner i LINK2.


- Man kan skapa samordningsärenden både vid inskrivning i slutenvård och från öppenvård.
- Öppenvården kan skicka kallelse till SVPL.
- SIP skrivs i Link.
- Ärendet finns kvar även patienten läggs in på annan kliniken.
- Ärendet fortsätter även när patienten skrivs ut från sjukhuset.
- Man kan se i Patientlisten om patienten har ett pågående samordningsärende.
- Fler yrkesroller kan ha behörighet.
- Fler underenheter för kommunerna, underlättar t.ex. vid sortering.
- Möjligheten att kunna rikta meddelanden.
- Att man ska kunna bjuda in fler deltagare, till exempel öppenvården inom psykiatri.
- Behörighet för administrering av sk. frastexter även för kommunen.

### 3.2 Projekt mål

Att LINK2 implementeras i verksamheten i Regionen och kommunerna i Jönköpings län vecka 48 2018.

Utförare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  6 (11)
Projekt LINK2	Noteringar			Informationsklass

### 3.3 Prioriteringstriangel

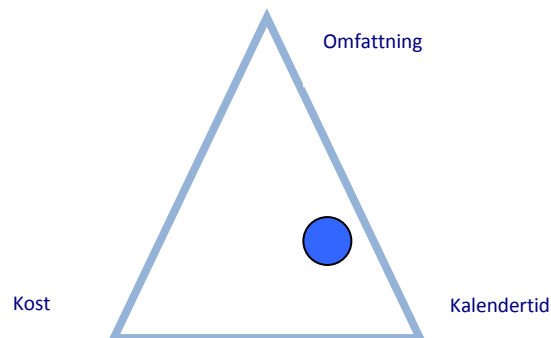

Tiden är den viktigaste prioriteringen med anledning av att vecka 48 är aktuell beslutad vecka för införandet av LINK2.

Kalendertid	Omfattning	Kostnad
60	30	10

Utförare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  7 (11)
Projekt LINK2	Noteringar			Informationsklass


### 3.4 Tidsplan

Övergång från LINK till LINK2 sker i samband med uppgradering till FP3 v 48. Bilderna nedan beskriver den övergripande planeringen samt förberedelser och utbildning inför implementeringen av LINK2 i verksamheten i slutenvård, primärvård och kommuner. Inför uppgraderingen till Link 2 pågår förberedelser dels ur ett IT-perspektiv och även ur ett verksamhetsnära perspektiv.


**Starttid:** 2018-06-01

**Sluttid:** 2018-12-31

#### Övergripande plan, IT-centrum (ITC) och Folkhälsa och Sjukvård (FS)

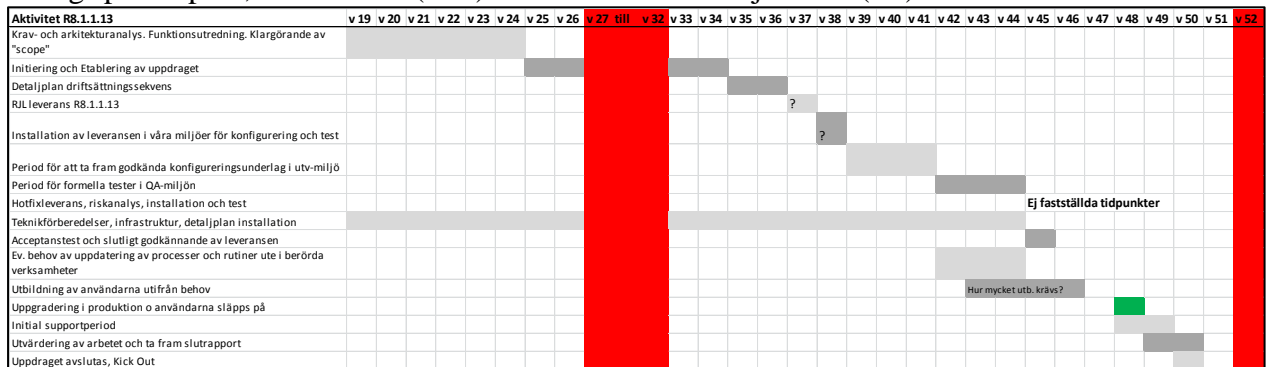

#### Förberedelser och utbildning, IT-centrum och Folkhälsa och Sjukvård

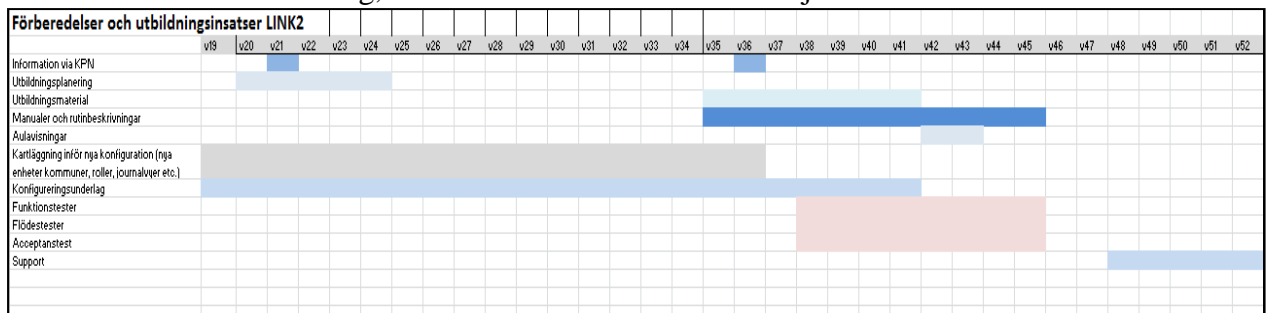

## 4 Omfattning

### 4.1 Omfattning

Implementering av LINK2 omfattar förberedelser, utbildning och support. Beroende finns till uppgraderingen till FP3, som Link2 är en del av. Driftsättningen av FP3 innebär att LINK2 finns i drift direkt i samband med driftsättning, och detta går inte att påverka eller ändra. Detta medför

Utfärdare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  8 (11)
Projekt LINK2	Noteringar		Informationsklass	

noggranna förberedelser och god planering. Tidplan och omfattning framgår av bilderna ovan under rubriken Tidsplan.

## 4.2 Beroenden till andra projekt

LINK2 ingår i leveransen av FP3, Cambio Cosmic, varför dessa delar behöver gemensam planering. Övergången från Link till LINK2, sker direkt vid uppgradering till FP3, vilket innebär att noggrann planering, utbildning och förberedelser är nödvändigt för att LINK2 ska kunna användas i verksamheten när övergången sker.

## 4.3 Avgränsningar

- Eventuella behov av förändringar i hanteringen av kommunernas behörigheter ingår inte i projektet
- Eventuella behov av ändringar i befintliga eller behov av utveckling av nya Diver-rapporter ingår inte i projektet och hanteras inom ordinarie förvaltningsprocesser
- Eventuella behov av ändringar i betalningsprocessen på Ekonomiavdelningarna inom Regionen och Kommunerna ingår inte

## 5 Nyttor

Förväntade nyttor med LINK2 är bland annat förbättrade arbetsrutiner och smidigare arbete enligt vårdplaneringsprocessen. LINK2 innehåller ändamålsenliga funktioner anpassade till vårdplaneringsprocessen baserade på de krav och förändrade arbetssätt som den nya betalningsansvarslagen medför när det gäller samordning och rutiner inom specialiserad vård, primärvård och kommun.

## 6 Ekonomi

### 6.1 Finansiering

Nuvarande finansieringsmodell som gäller för Cosmic.

### 6.2 Kostnader

Region Jönköpings län står för kostnaden och kommunen är delaktiga i supportkostnader enligt nuvarande supportavtal.



Utfärdare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  9 (11)
Projekt LINK2	Noteringar		Informationsklass	

### 6.3 Resurser

Roll	Organisation	Ungefärlig omfattning (%)
Projektledare	IT-centrum	
Projektledare	IT-centrum	
Kravanalytiker	IT-centrum	
IT-arkitekt	IT-centrum	
Testledare	IT-centrum	
Utredare	Folkhälsa och Sjukvård	
Utredare	Folkhälsa och Sjukvård	
Applikationsspecialist	IT-centrum	
Applikationsspecialist	IT-centrum	
FoU-ledare	Kommunal Utveckling	

### 6.4 Styrgrupp

eHälsorådet är styrgrupp.

## 7 Förvaltningsansvar

Folkhälsa och sjukvård och IT-centrum ansvarar för LINK2 enligt befintlig förvaltningsplan för Cosmic och sjukvårdens IT-stöd.

## 8 Legala frågor

Nya betalningsansvarslagen gäller från och med 2018-01-01. Den nya lagen och dess konsekvenser för hantering av betalningsansvar och dess beräkning har beaktats i utvecklingen av LINK2. En lokal överenskommelse mellan Region Jönköpings län och länets kommuner har träffats, och en ersättningsmodell har tagits fram och beslutats för tillämpning av den nya betalningsansvarslagen.

Utfärdare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  10 (11)
Projekt LINK2	Noteringar			Informationsklass

## 8.1 Lagar och Avtal

Nya betalningsansvarslagen gäller från och med 2018-01-01. Den nya lagen och dess konsekvenser för hantering av betalningsansvar och dess beräkning har beaktats i utvecklingen av LINK2. En lokal överenskommelse mellan Region Jönköpings län och länets kommuner har träffats, och en ersättningsmodell har tagits fram och beslutats för tillämpning av den nya betalningsansvarslagen. [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran\\_sfs-2017-612](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612)

1§ I denna lag finns bestämmelser om

1. bestämmelser och tillämpning av samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från slutna vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården,
2. hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna, och
3. kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter

2§ Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från slutna vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.

<https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/sammanhallenvardomsorgaldre/samverkaavidutskrivningfransjukhus.13624.html>

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i kraft. Bestämmelser om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan ska tillämpas. Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Den ersätter lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Utfärdare/Enhet Helena Blom Håkansson Anette Peterson Region Jönköpings län	Telefon	Datum 2018-05-21	Version	Sida  11 (11)
Projekt LINK2	Noteringar			Informationsklass

## 9 Begrepp och definitioner

Begrepp	Beskrivning
SIP	Samordnad individuell plan

## 10 Bilagor

Underskrift av Beställare

Underskrift av Projektledare

Namn

Datum

Namn

Datum
